

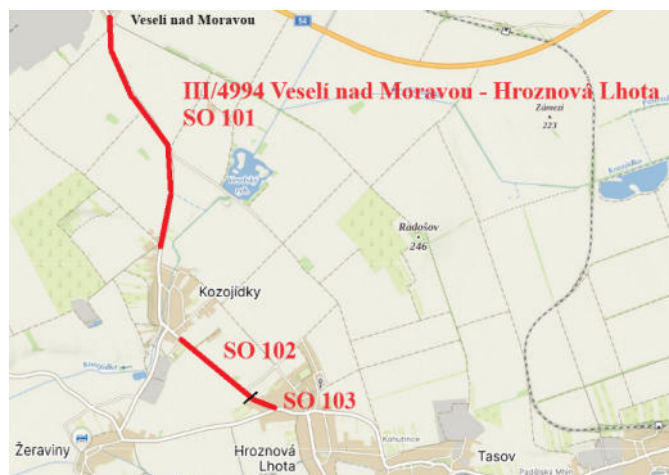
## REFERENČNÍ LIST STAVBY

**Název stavby:****III/4994 Veselí nad Moravou –  
Hroznová Lhota****Stav před opravou:**

Důvodem opravy silnice III/4994 v celkové délce 3,158 km z toho mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Kozojídky v délce 2,081 km a mezi obcí Kozojídky a obcí Hroznová Lhota včetně části jejího intravilánu po křižovatku se silnicí III/4992 v délce 1,077 km byl velmi špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. V opravovaném úseku vykazovala komunikace nerovnosti především po krajích vozovky, poruchy krytu způsobené především těžkou dopravou zaměřenou na přepravu dřeva. Z těchto důvodů byla provedena souvislá oprava této komunikace, která přispěje ke zkvalitnění jízdy a zvýšení její bezpečnosti.

**Nový stav:**

Při opravě komunikace III/4994 bylo provedeno frézování asfaltových vrstev, provedena sanace krajů vozovky oboustranně v celkové tloušťce 900 mm a to mimo intravilánu obce Hroznová Lhota v úseku mezi obrubami. Následně byla provedena recyklace za studena na místě RS 0/45 CA v tl. 180 mm. a položeny 2 asfaltové vrstvy (ACL 16+ v tl. 60 mm a obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 40 mm). Součástí bylo napojení komunikací a sjezdů, pročistění příkopů a zřízení nebezpečné krajnice mezi obcemi. Bylo provedeno nové VDZ ve zvučícím plastu, v intravilánu obce Hroznová Lhota v nezvučícím plastu, a instalovány směrové sloupky.

**Projektant:** Dopravoprojekt Ostrava a.s.**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Termín realizace:** 6 - 11/2025**Náklady stavby:** 41 814 tis. Kč s DPH**Zdroj financování:** OPRAVY SILNIC, SFDI NIV.**Mapa***Stav silnice před opravou**Stav silnice po opravě*
