

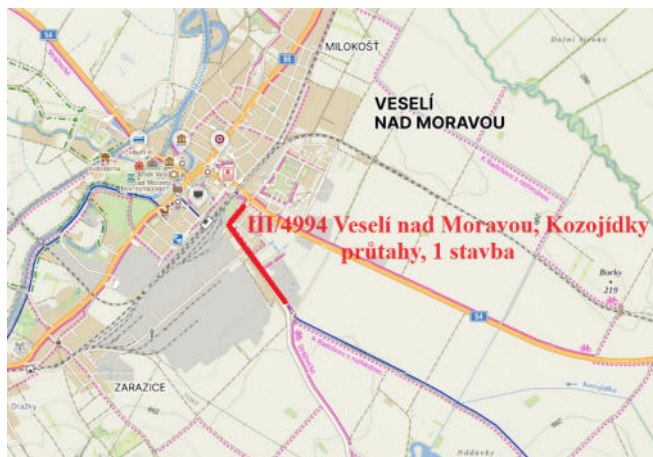
## REFERENČNÍ LIST STAVBY

**Název stavby:****III/4994 Veselí nad Moravou,  
Kozojídky průtahy, 1. stavba****Stav před opravou:**

Důvodem opravy silnice III/4994 v intravilánu a extravilánu města Veselí nad Moravou v celkové délce 1,226 km byl velmi špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. V opravovaném úseku vykazovala komunikace nerovnosti, poruchy krytu a příčné trhliny. Z těchto důvodů byla provedena souvislá oprava této komunikace, která přispěje ke zkvalitnění jízdy a zvýšení její bezpečnosti.

**Nový stav:**

Při opravě silnice III/4994 bylo provedeno frézování komunikace v tl. 120 mm a dalších 50 mm v místech rozpadu podkladních vrstev. Následně došlo k pokládce vrstev ACP 16+ v tl. 50 mm, ACL 22+ v tl. 80 mm a ACO 11+ v tl. 40 mm. Součástí bylo napojení komunikací a sjezdů, výměna obrub a pokládka jednořádku z žulových kostek, úpravy vpustí, šachet, na konci úseku zřízení nezpevněné krajnice, příkopů a propustků. Bylo provedeno nové VDZ v nezvučícím plastu, rocbinda a instalovány směrové sloupky v úseku bez silničních obrub.

**Projektant:** Dopravoprojekt Ostrava a.s.**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Termín realizace:** 6 - 9/2025**Náklady stavby:** 16 153 tis. Kč s DPH**Zdroj financování:** OPRAVY SILNIC, SFDI NIV.,  
HOSPODÁŘSKY ZNEVÝHODNĚNÁ ÚZEMÍ**Mapa***Stav před opravou**Stav po opravě*
