

Název stavby:

II/414 Lechovice – Borotice

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce předmětného úseku mezi obcemi Lechovice a Borotice, byl špatný dopravně technický i stavební stav silnice a propustku v km 1,275. K nejvýznamnějším závadám vozovky patřily zejména, plošné deformace a výtluky. Propustek měl zkorodované nosné ocelové prvky, degradované betonové části a posunuté kameny v čele i křídlech.

Nový stav:

Stavba zahrnovala provedení opravy krytu silnice II/414 v extravilánovém úseku v km 0,335 - 2,230, mezi obcemi Lechovice – Borotice, včetně provedení opravy propustku v km 1,275.

Oprava silnice (objekt SO 1) byla provedena v délce 1895 m zesílením krytu vozovky obrusnou vrstvou ACO 16+, tl. 60 mm, vč. vyspravení nerovností a propadených krajů vozovky a dalších souvisejících prací.

Propustek (objekt SO 201) byl proveden jako ŽB prefabrikovaný rám se světlostí otvoru 2 x 1 m, délky 9 m, umístěný na ŽB desku, vtok i výtok byl vydlážděn kamennou dlažbou, dále budou provedeny ŽB křídla, ŽB římsy, na návodní straně opěrná zeď a další související práce.

Projektant: IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČO: 27689328


Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
IČO: 02604795

Termín realizace: 10/2017 - 11/2017

Náklady stavby: 5 694 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, NIV. SÚS JMK

Mapa

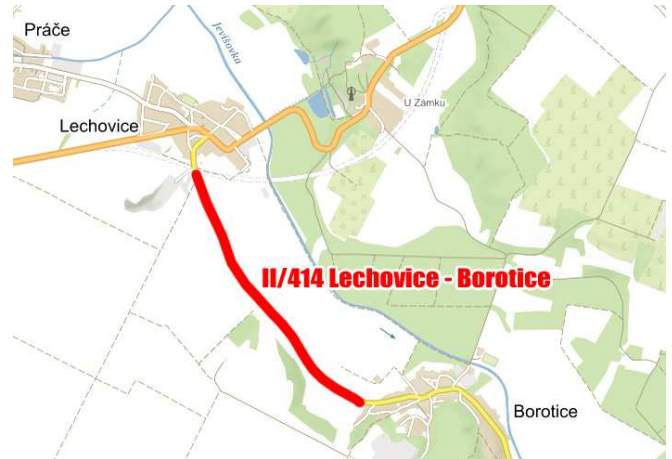

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

